АВТОМАГИСТРАЛА

ХЕМУС

Участък до ПВ Плевен

НАПРЕДЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО

ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО

26.06.2026 г. **Инж. Христо Славчев**

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Кратък обзор

Напредък на строителството

Участък 2 от км 103+060 до км 122+260

КРАТЪК ОБЗОР



АМ ХЕМУС Участъци за доизграждане

Участъци от 1 – 6 с обща дължина 134,2 км

- Участък 1 от км 87+800 до км 103+060;
- Участък 2 от км 103+060 до км 122+260;
- Участък 3 от км 122+260 до км 139+340 до ПВ Плевен;
- Участък 4 от км 139+340 до км 166+144.09;
- Участък 5 от км 166+144,09 до км 189+344;
- Участък 6 от от км 189+344 до км 222+000

Участъци от 7 – 9 с обща дължина 88,940 км

- Участък 7 от км 222+000 до км 265+600;
- Участък 8 от км 265+600 до км 299+000;
- Участък 9 от км 299+000 до км 310+940;


АМ ХЕМУС Участъци за доизграждане

Участъци от 1 – 6 с обща дължина 134,2 км

- Участък 1 от км 87+800 до км 103+060;
- Участък 2 от км 103+060 до км 122+260;
- Участък 3 от км 122+260 до км 139+340 до ПВ Плевен;
- Участък 4 от км 139+340 до км 166+144.09;
- Участък 5 от км 166+144,09 до км 189+344;
- Участък 6 от от км 189+344 до км 222+000

АМ ХЕМУС Участъци за доизграждане

Участъци от 1 – 6 с обща дължина 134,2 км

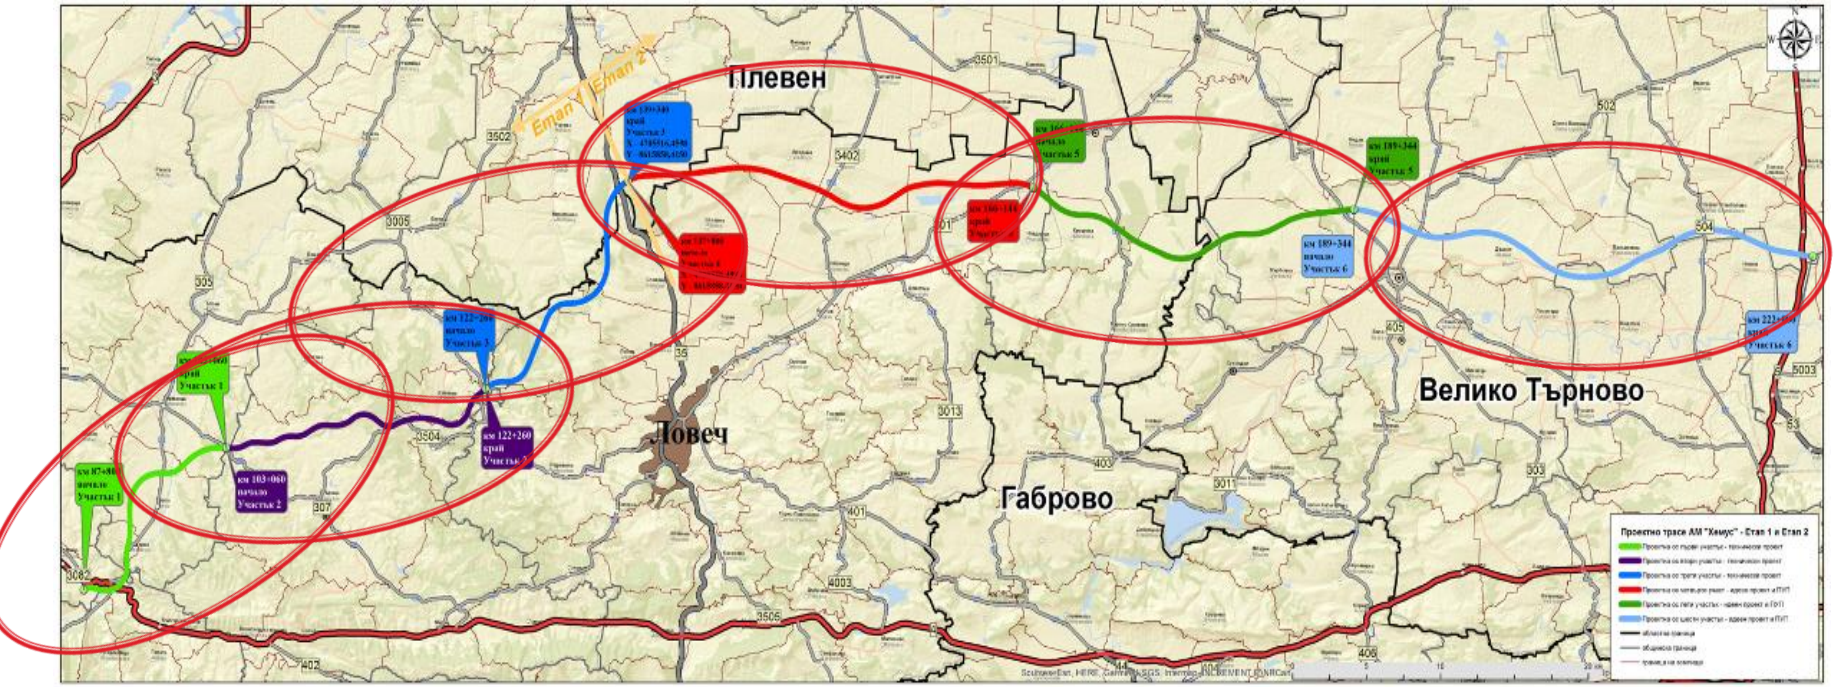

АМ ХЕМУС Участъци от 1 – 6

Участъци от 1 – 6 с обща дължина 134,2 км

Изпълнител: „Автомагистрали“ ЕАД

Договорно споразумение: № Д-122/20.12.2018 г.

Стойност на договора: 1 124 880 000 лв. без ДДС

Срок за изпълнение:


Участъци от 1 до 3 - 36/48/36 месеца (по договор)

Участъци от 4 до 6 - 180 дни

АМ ХЕМУС Участъци от 1 – 6

Участъци от 7 – 9 с обща дължина 88,940 км


- Участък 7 от км 222+000 до км 265+600;
- Участък 8 от км 265+600 до км 299+000;
- Участък 9 от км 299+000 до км 310+940;

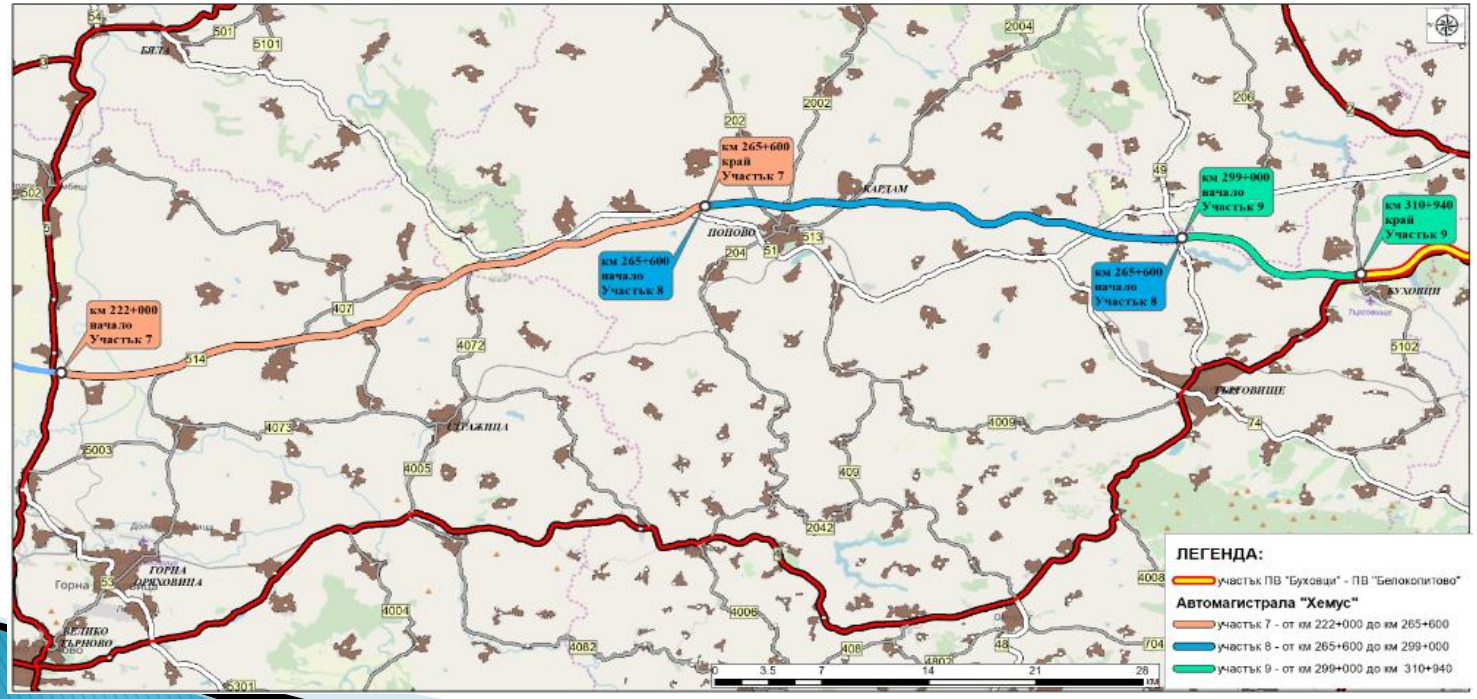

АМ ХЕМУС Участъци от 7 – 9

Участъци от 7 – 9 с обща дължина 88,940 км


Участък 7 от км 222+000 до км 265+600
43.6 км

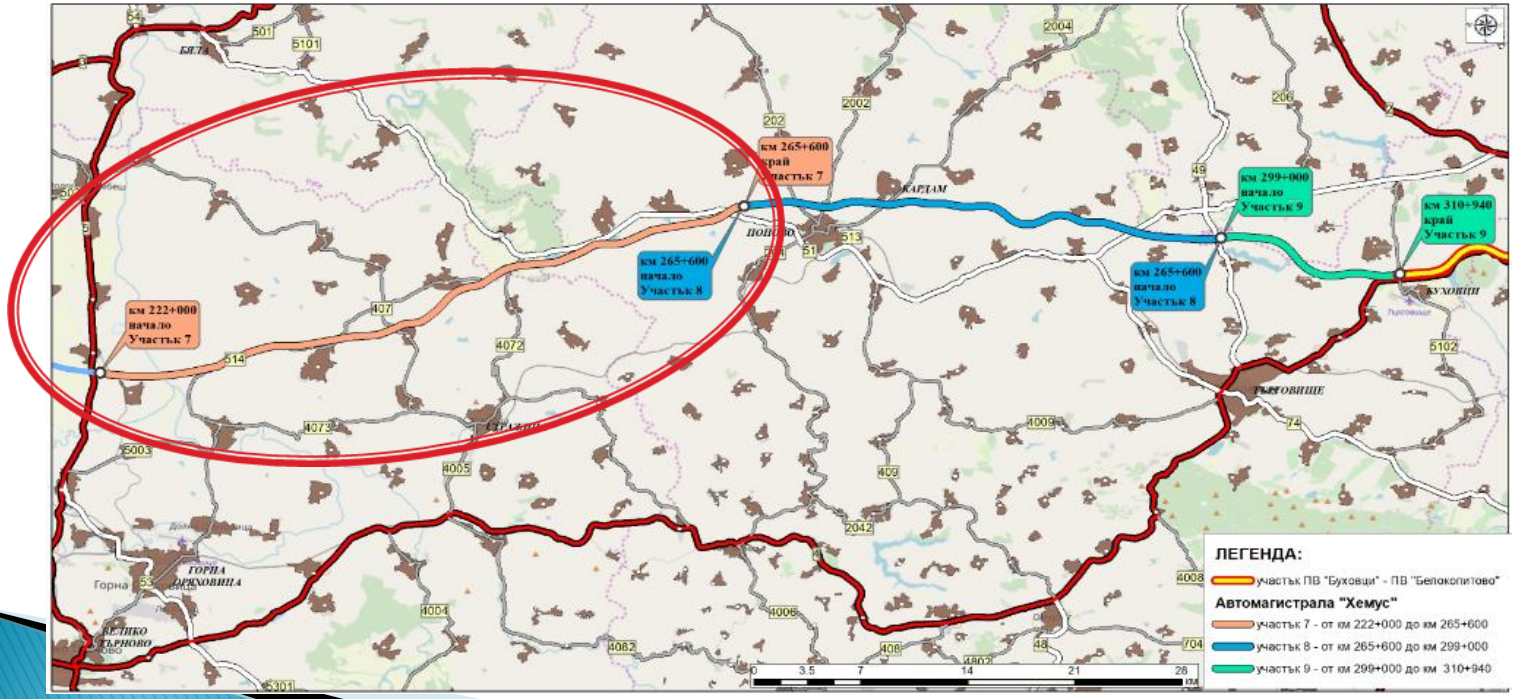

АМ ХЕМУС Участъци от 7 – 9

Участъци от 7 – 9 с обща дължина 88,940 км


Участък 8 от км 265+600 до км 299+000
33,5

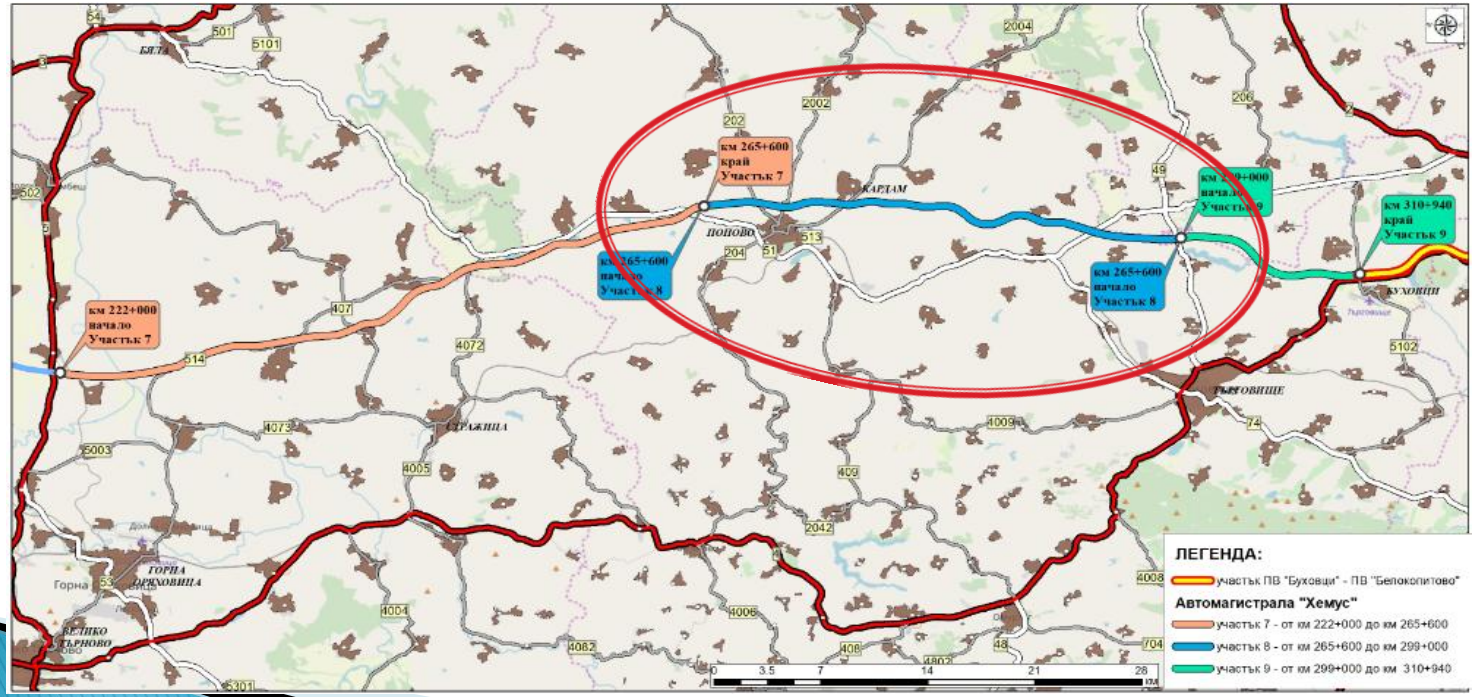

АМ ХЕМУС Участъци от 7 – 9

Участъци от 7 – 9 с обща дължина 88,940 км

Участък 9 от км 299+000 до км 310+940
11,9 км

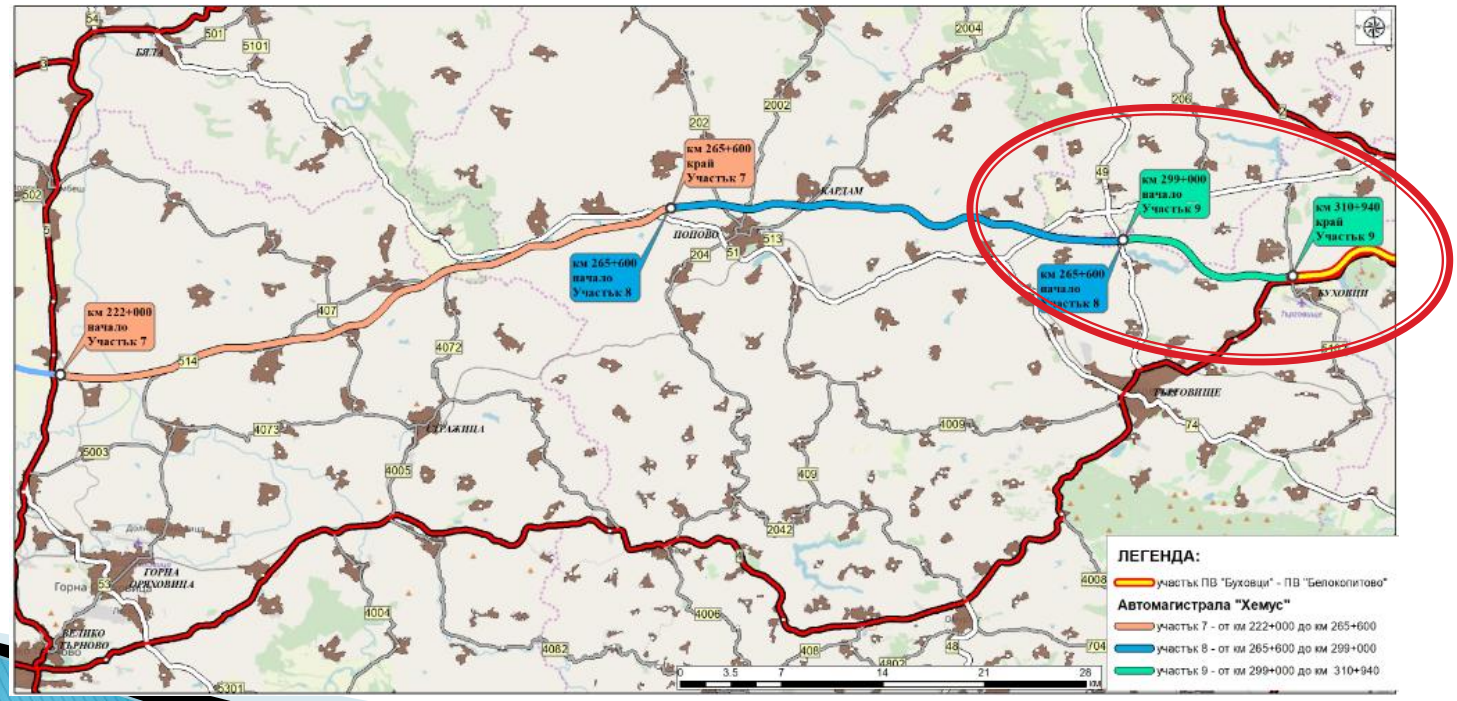

АМ ХЕМУС Участъци от 7 – 9

Участъци от 7 – 9 с обща дължина 88,940 км

Изпълнител: „Автомагистрали“ ЕАД

Договорно споразумение: № РД-33-16/18.12.2019 г.

Стойност на договора: 1 150 000 000 лв. без ДДС

АМ ХЕМУС

НАПРЕДЪК НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА УЧАСТЪЦИ 1, 2 И 3

Участък 1 – изпълнен 100 %

Участък 2 – изпълнен на около 42%

Участък 3 – изпълнен на около 58%

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км и

УЧАСТЪК 2.2. - от км 115+800 до км 122+260 с дължина 6,460 км.

Изпълнител: Автомагистрали ЕАД

Строителен надзор: Логистика 22 ЕООД / Трансконсулт Група

РС - № РС-69/27.08.2020 г.


Заповед № РС-40/29.06.2022 г. - участък от км 113+780 до км 120+600

Заповед № РС-41/01.07.2022 г. - участък от км 103+060 до км 113+780

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км

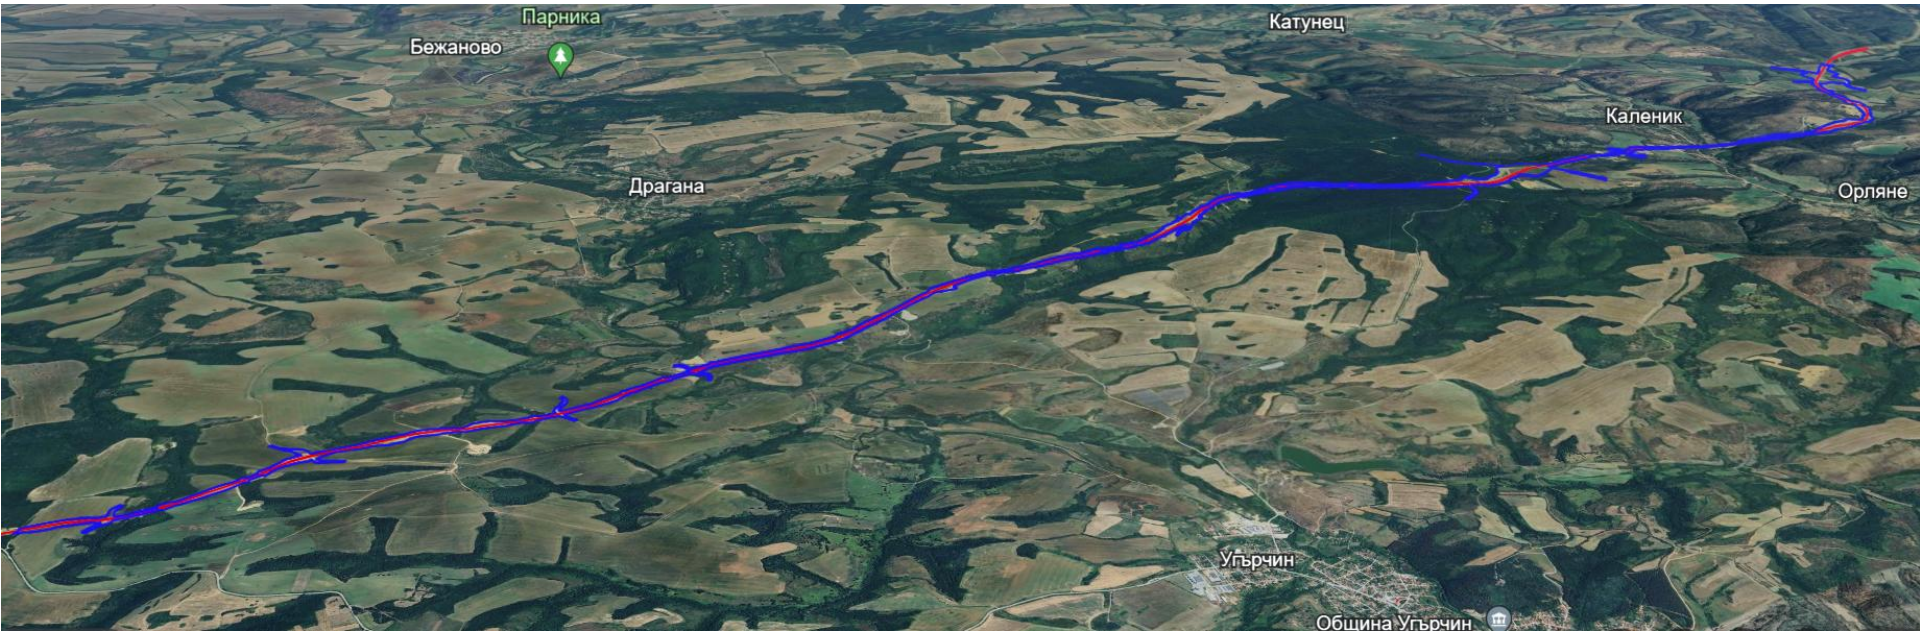

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2 ПОДУЧАСТЪК 2.1 12,740 КМ



Големи съоръжения – 7 с дължина 2466 м до 32 м височина;

Армонасипни стени – 6 бр.

Пресичания със ССП – 4 бр.

Реконструкция на път III-3504 и път LOV2201

ПВ Угърчин

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от [redacted] ължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС


ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км




АМ ХЕМУС
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.2. - от км 115+800 до км 122+260 с дължина 6,460 км.

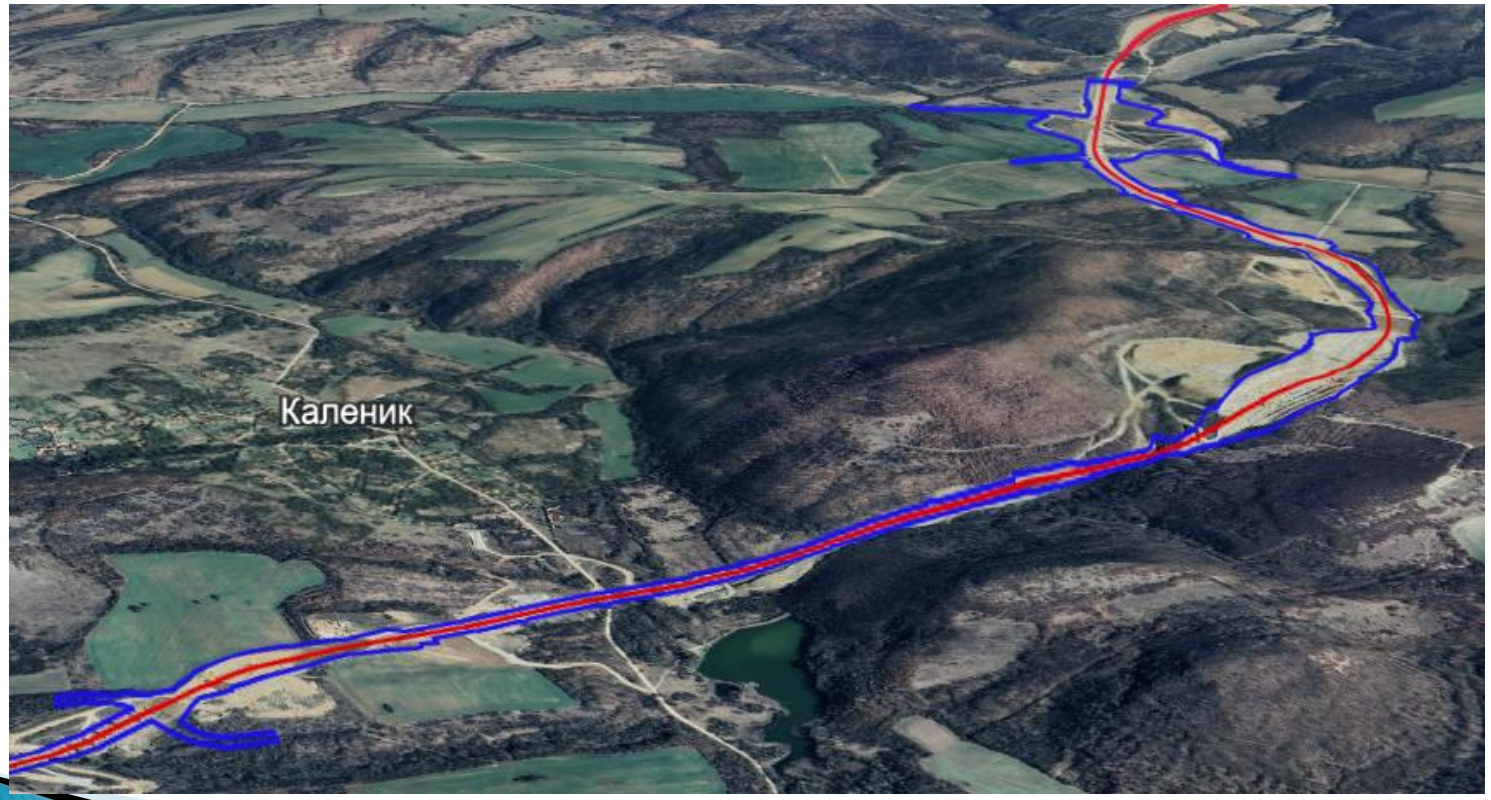

АМ ХЕМУС
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.2. - от км 115+800 до км 122+260 с дължина 6,460 км.

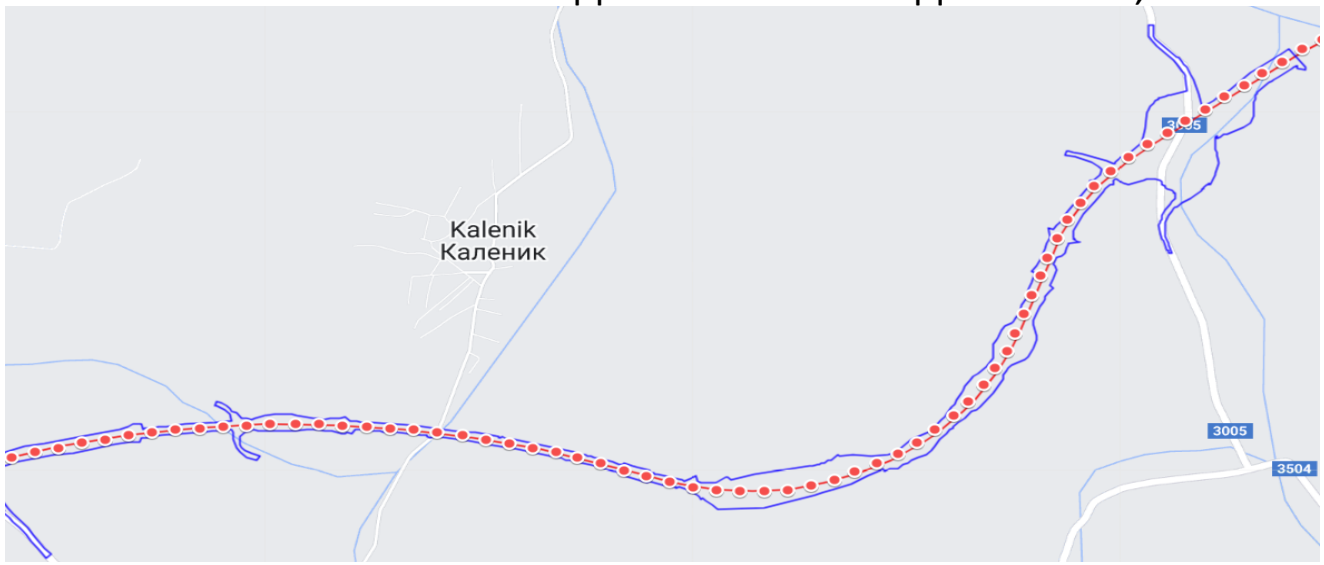

Големи съоръжения – 4 с дължина 2926 м до 32 м височина;

Армонасипни стени – 7 бр.

Пресичания със ССП – 2 бр.

Реконструкция на път III-3005

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км




АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



УЧАСТЪК 2.1. - l2,740 км

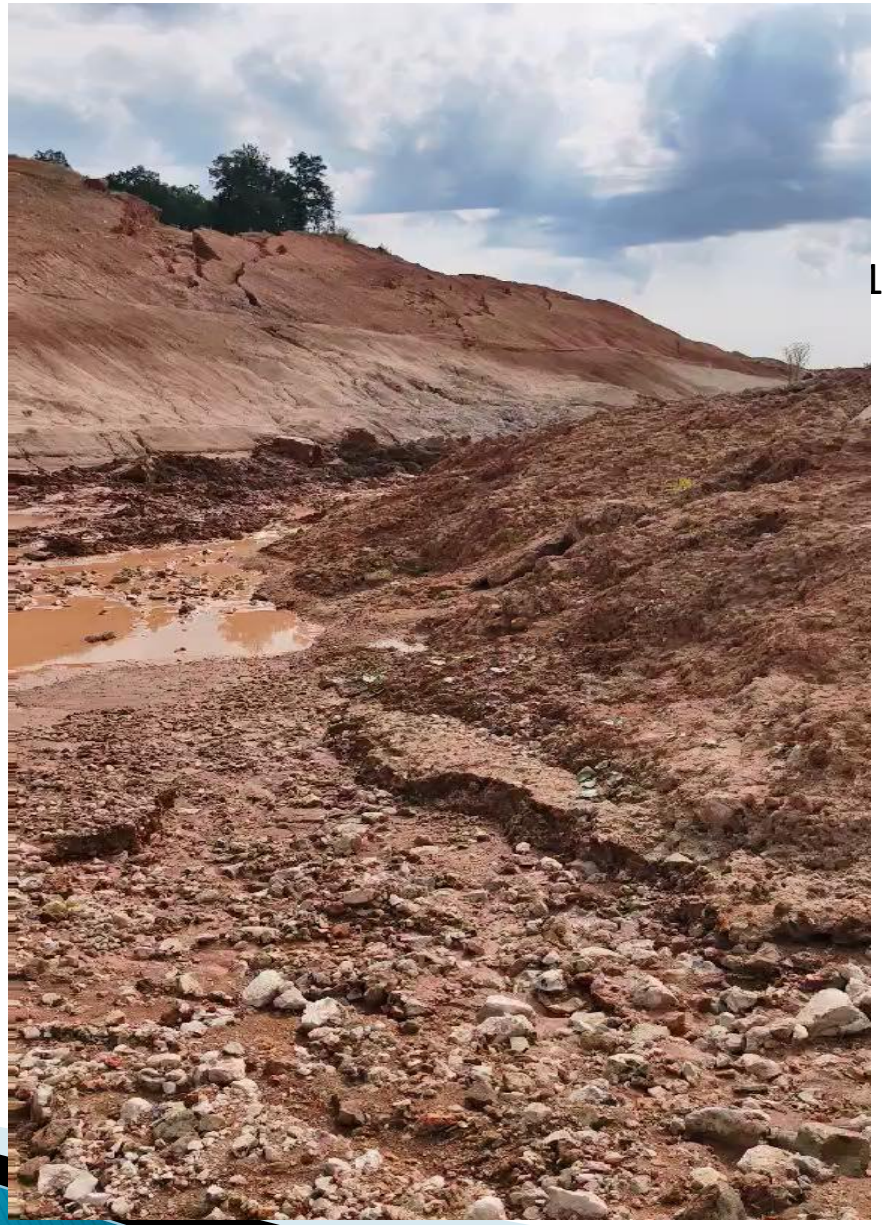

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12,740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 2

УЧАСТЪК 2.1. - от км 103+060 до км 115+800, с дължина 12.740 км



АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 3

Участък 3 от км 122+260 до км 139+340 до ПВ Плевен

От пътен възел „Каленик" (пресичане с път III-3005) до път II-35 (Плевен – Ловеч).

Пътни възли: 1 бр. (пътен възел „Плевен" при км 139+340).
Съоръжения: Включва 6 виадукта и 9 надлеза/подлеза.
Текущ статут и напредък (2026 г.)
Подучастък 3.1: Има промени в техническите характеристики на четири виадукта и три надлеза (напр. мост при км 125+888 ще се изгражда чрез конзолно бетониране с 3 отвора).
Подучастък 3.2: В процес на активно строителство (простира се от път LOV1054 до пътен възел „Плевен" с дължина около 7 км).

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 3

Участък 3 от км 122+260 до км 139+340 до ПВ Плевен

От ПВ „Каленик" (пресичане с път III-3005) до път II-35 (Плевен – Ловеч).

Изпълнение приблизително 58 %

Очакван срок за завършване

Поради сложността на съоръженията в подучастък 3.1 (които изискват най-малко 3 години за изпълнение) и промените в проекта, цялостното завършване на Участък 3 се очаква в периода **2028 година**

АМ ХЕМУС

УЧАСТЪЦИ 4, 5 И 6

Участък 4 (Плевен – Летница): Разрешенията за строеж финализирани през 2025 г.
Строителната площадка е открита.
Изпълнение към момента **около 30 %**
Срок за завършване 2027 година

Участък 5 (Летница – Павликени): Има издадено разрешение за строеж.
Срок за завършване 2028 година

Участък 6 (Павликени – път I-5 /Русе-Велико Търново/):
Има издадено разрешение за строеж май 2026 г. за близо 32 км
Срокът за завършване на този лот е 44 месеца

АМ ХЕМУС

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТЪК 3

Участък 3 от км 122+260 до км 139+340 до ПВ Плевен

Участък 7 – Извършва се препроектиране на подучастък 7.1. За подучастък 7.2 ще има нова процедура по ОВОС, която ще отнеме години, а за 7.3 се извършва препроектиране и след като е готово ще се минава процедура по преценка дали има нужда от нов ОВОС.
Участък 8 – Проектната документация е предоставена в АПИ и се очаква одобрение на проекта, след което ще бъде стартирана процедура по одобрение на ПУП-Парцеларен план.
Участък 9 – Отчужденията са направени и се очаква Разрешение за Строеж в най-кратки срокове.
Прогнозният срок на МРРБ за изграждането на цялата АМ Хемус е 2030 г.

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Проблеми при строителството

Технически

Административни

Финансови

Организационни и кадрови

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Проблеми при строителството

Технически

- Пропуски в инженерно-геоложките проучвания – строителство в карстов район у-ци 2 и 3
- Разположение на подземните инженерни мрежи
- Непредвидени високи подпочвени води
- Липса на познание на Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Проблеми при строителството

Административни

- Договори за строителство и строителен надзор
- Тромави процедури по взимане на решение
- Процедури, свързани с получаване на разрешения и съгласувания;
- Процедури по проучване на археологически обекти

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Проблеми при строителството

Финансови

- Единичните цени на видовете работи;
- Одобряване на единични цени преди изработването на техническите проекти;
- Неактуализирани количествено-стойностни сметки
- Забавяне в плащанията за извършените работи

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Проблеми при строителството

Организационни и кадрови

- Липса на достатъчно квалифицирана работна ръка
- Липса на технически кадри
- Лоша комуникация и координация между страните участници в строителството

АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

Резултат от Проблемите

Реалистичен срок



НАУЧНО ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО „ТРАНСПОРТА“

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

26.06.2026 г.
